


# 平成24年度 工事実施状況

両総地区

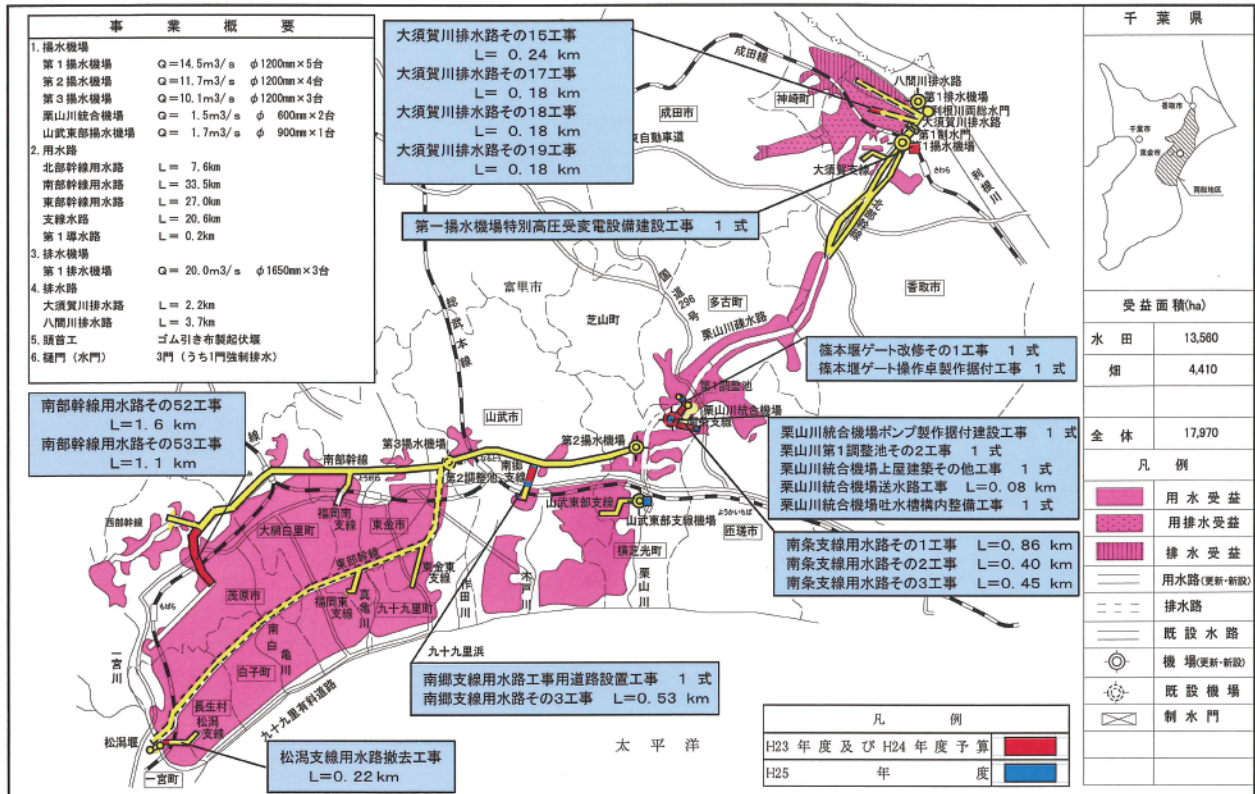

## 平成24年度 両総地区の工事実施計画について

### 1. 国営事業の実施状況

(単位:百万円)

工期	総事業費	H23年度	H23年度迄額	同進捗率	H24年度	H24年度以降額	H24年度迄進捗率	備考
H5~H25	108,000	[ 780 ] (3,527) 3,015	(100,129) 99,379	92.0%	(4,302) 3,600	(9,908) 8,621	95.4%	[ ]三次補正予算額 ( )受託費込み額

### 2. 平成24年度 主要工事実施計画

NO.	工事名	工期	主要工事等
1	大須賀川排水路その15工事	H 24. 9~H 25. 5	河川・排水路工事 L=240m( 橋梁含む)
2	大須賀川排水路その17工事	H 24. 9~H 25. 5	河川・排水路工事 L=180m
3	大須賀川排水路その18工事	H 24. 9~H 25. 5	河川・排水路工事 L=180m( 橋梁含む)
4	大須賀川排水路その19工事	H 24. 9~H 25. 5	河川・排水路工事 L=180m
5	第一揚水機場特別高圧受変電設備建設工事	H 23. 8~H 26. 2	特別高圧受変電設備他 1式
6	篠本堰ゲート改修その1工事	H 24. 3~H 25. 2	ゲート1門製作据付、2門補修
7	篠本堰ゲート操作卓製作据付工事	H 24. 7~H 25. 2	ゲート操作卓他 1式
8	栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事	H 24. 6~H 25. 9	農水ポンプ 3台、県排水ポンプ 3台
9	栗山川第1調整池その2工事	H 24. 10~H 25. 3	護岸工 L=200m
10	栗山川統合機場上屋建築その他工事	H 24. 9~H 25. 3	上屋工( 農水 1棟、県排水 1棟)
11	栗山川統合機場送水路工事	H 24. 10~H 25. 3	鋳鉄管他φ800 L=80m
12	栗山川統合機場吐水槽構内整備工事	H 24. 4~H 24. 7	As舗装、防護柵他 1式
13	南条支線用水路その1工事	H 24. 9~H 25. 3	FRPM管他φ800 L=860m
14	南条支線用水路その2工事	H 24. 9~H 25. 3	FRPM管他φ800~600 L=400m
15	南条支線用水路その3工事	H 24. 11~H 25. 3	FRPM管他φ600 L=450m
16	南郷支線用水路工用道路設置工事	H 24. 9~H 25. 1	工用道路 L=1,580m
17	南郷支線用水路その3工事	H 24. 10~H 25. 6	FRPM管他φ1,000~900 L=530m
18	南部幹線用水路その52工事	H 24. 6~H 25. 3	FRPM管他φ1,100 L=1,550m
19	南部幹線用水路その53工事	H 24. 7~H 25. 3	FRPM管他φ1,100 L=1,080m
20	松濁支線用水路撤去工事	H 24. 10~H 25. 2	旧開水路撤去 L=220m

※関係者との合意形成状況、作業進捗等により工事発注時期や内容が変更となる場合がある。

### 3. 上記を踏まえた残事業

栗山川統合機場 (ポンプ、篠本堰ゲート、除塵機等)、南郷支線用水路 (L=0.4km)、南条支線用水路 (L=0.4km)、第一揚水機場特高受変電設備、水管理施設、完了整備 等
