


# 平成 27 年度 両総茂原南地区の工事実施状況について

## 1. 概要図

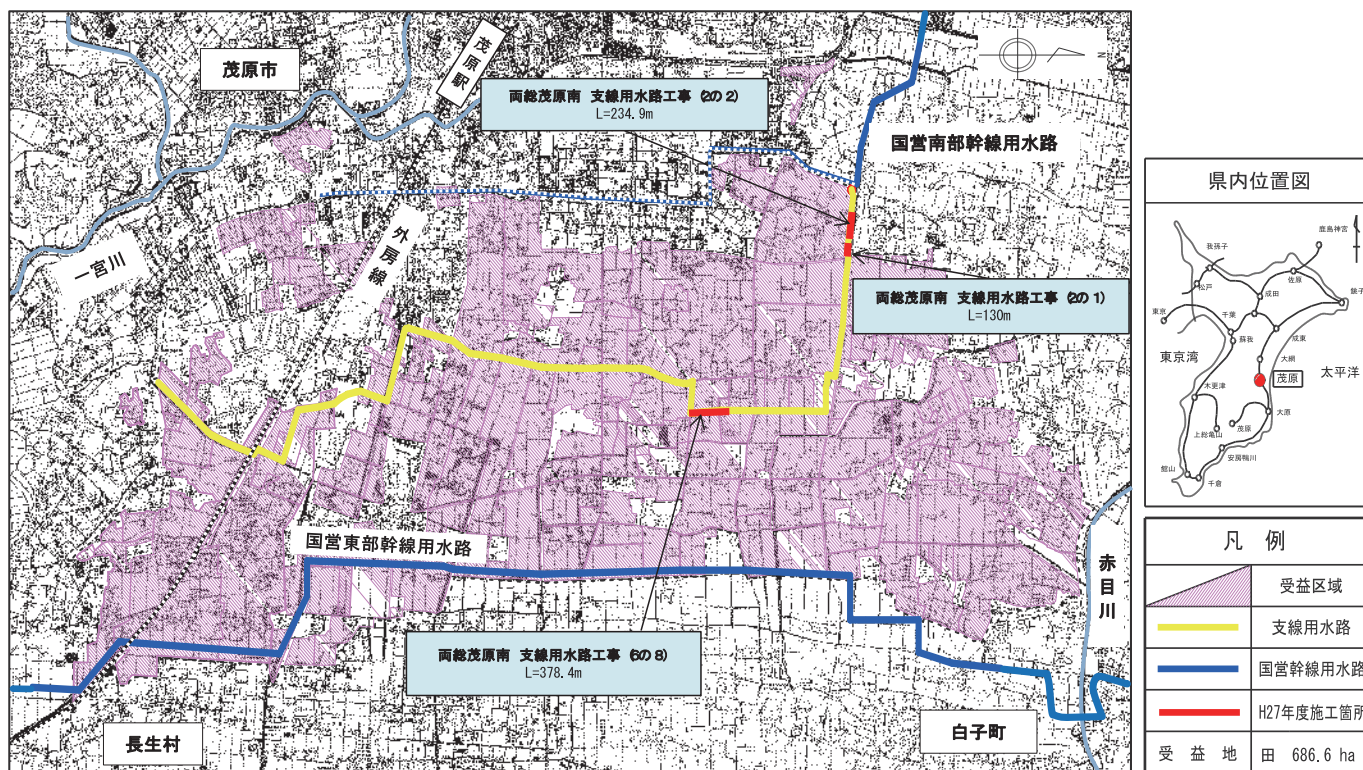

## 2. 県営事業の実施状況

工期	総事業費	H26年度	H26年度迄額	H27年度
H21～H30	2,264,000	139,135	959,039	187,510

## 3. 平成 27 年度主要工事実施計画

工事名	工事場所	工期	主要工事等
両総茂原南 支線用水路工事 (2の1)	茂原市本小轡地先	H27.3～H28.2	FRPM管(φ=1100mm)敷設工事 L=130.0m
両総茂原南 支線用水路工事 (2の2)	茂原市本小轡地先	H27.9～H28.2	FRPM管(φ=1100mm)敷設工事 L=234.9m
両総茂原南 支線用水路工事 (6の8)	茂原市千町地先	H27.10～H28.6	FRPM管(φ=1000mm)埋設工事 (推進工法) L=378.4m



管敷設状況



管敷設状況
