


平成 28 年度 両総茂原南地区の工事実施状況について

1. 概要図

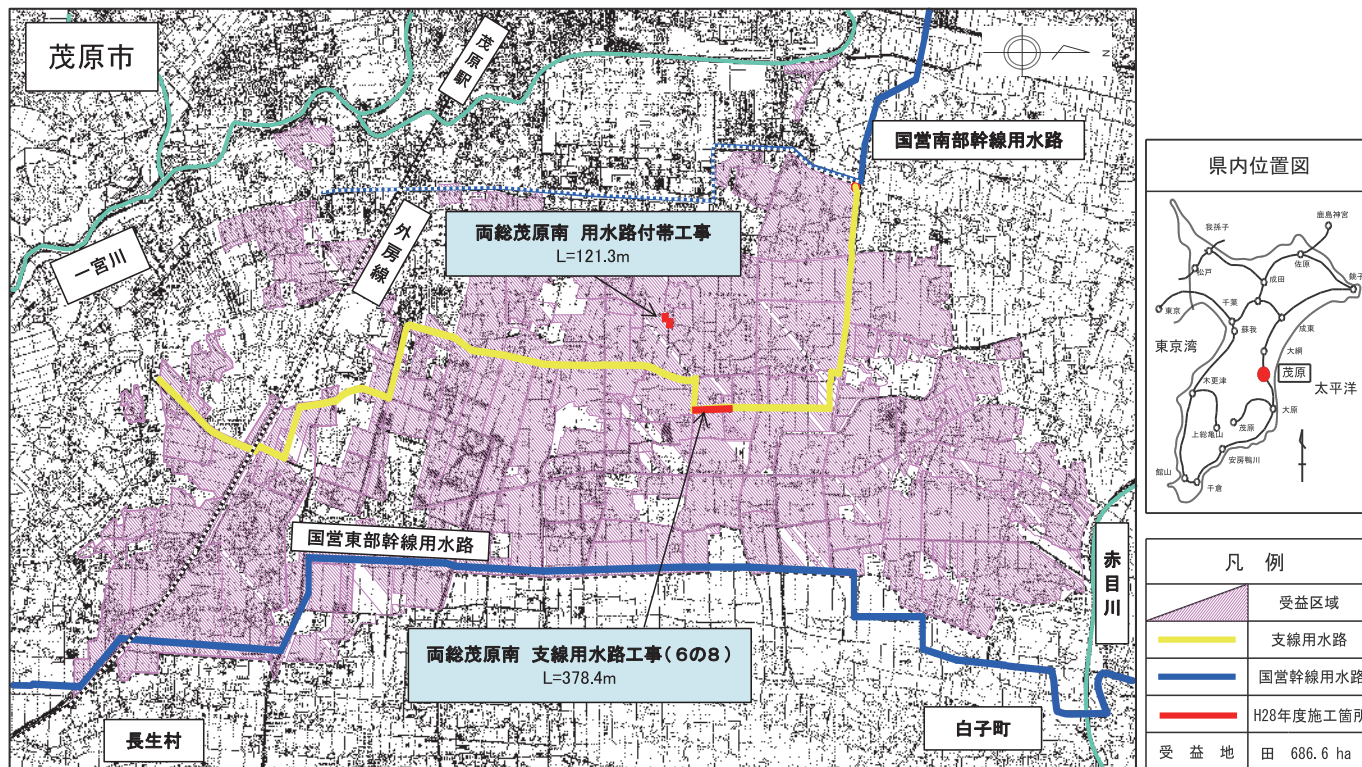

2. 県営事業の実施状況

(単位：千円)

工期	総事業費	H27年度	H27年度迄額	H28年度
H21～H30	2,289,000	190,941	1,149,980	163,150

3. 平成 28 年度主要工事実施計画

工事名	工事場所	主要工事等
両総茂原南 支線用水路工事 (6の8)	茂原市千町地先	FRPM管(φ=1000mm)敷設工事(推進工事) L=378.4m
両総茂原南 用水路付帯工事	茂原市谷本地先	VP管(φ=300mm)敷設工事 (素掘り工事) L=121.3m

