


# 平成30年度 県営かんがい排水事業 両総茂原南地区の工事实施状況について

南部幹線用水路下流部については、造成後50年以上が経過しており、県営かんがい排水事業にて平成26年度に更新整備を終えた国営事業に合わせ、路線の見直しを行い、パイプライン化する事業を実施しています。

## 1. 概要図

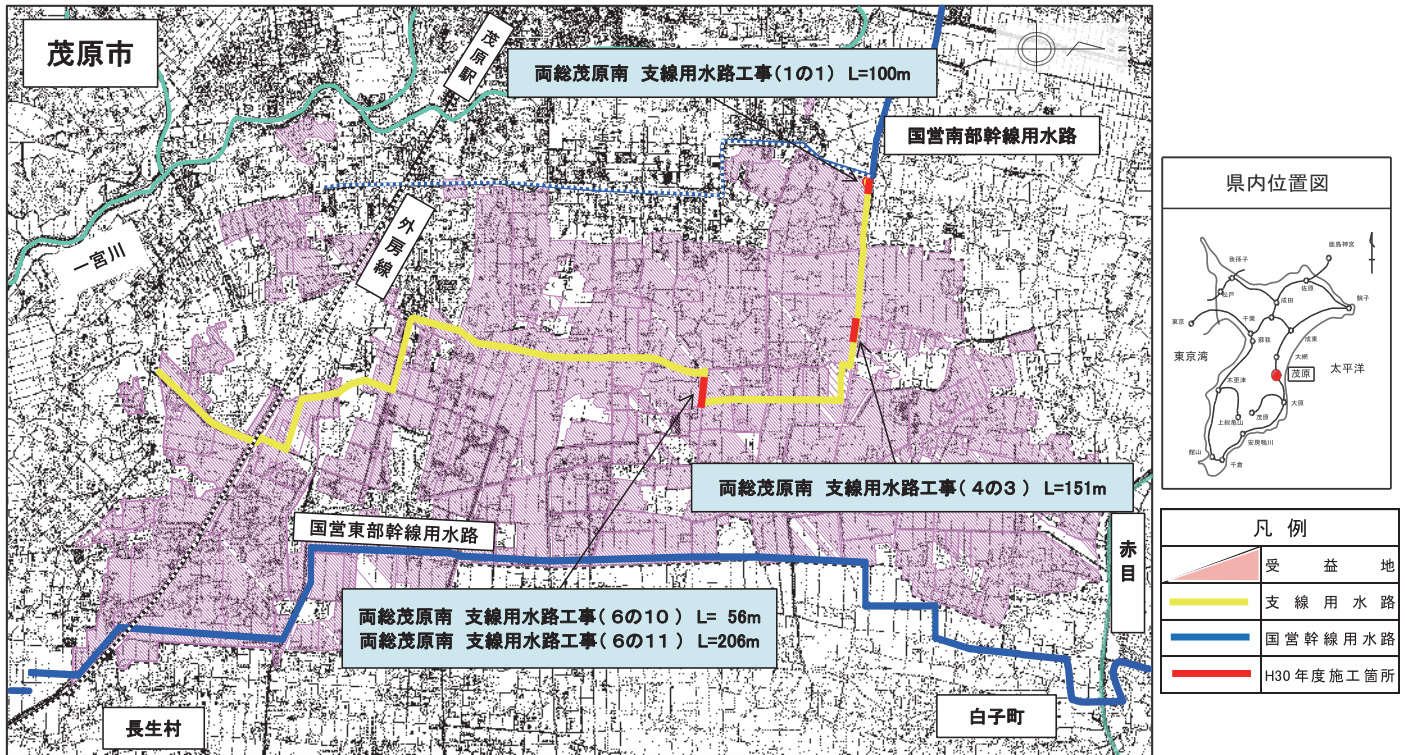

## 2. 県営事業の実施状況

(単位:千円)

工期	総事業費	H29年度	H29年度迄額	H30年度
H21年度～H31年度	2,312,000	84,565	1,393,406	308,062

## 3. 平成30年度主要工事实施計画

工事名	工事場所	主要工事等
両総茂原南 支線用水路工事(1の1)	茂原市本小轡地先	FRPM管(φ=1100mm)敷設工事 L=100m
両総茂原南 支線用水路工事(4の3)	茂原市小轡地先	FRPM管(φ=1000mm)敷設工事 L=151m
両総茂原南 支線用水路工事(6の10)	茂原市六ツ野地先	FRPM管(φ=1000mm)敷設工事 L=56m
両総茂原南 支線用水路工事(6の11)	茂原市六ツ野地先	FRPM管(φ=1000mm)敷設工事 L=206m

支線用水路3  
FRPM管施工状況



支線用水路6  
FRPM管施工状況

